



Répartition des Projets par Pays	
Afrique du Sud	
3	Total_Projets
Albanie	
2	Total_Projets
Allemagne	
3	Total_Projets
Belgique	
2	

Comment utiliser ce dashboard

Ce tableau de bord a été conçu pour **piloter l’avancement, les coûts et les livrables des projets Sanitoral**

1. Vue Globale – Performance & Suivi

- Vue d’ensemble du nombre de projets, phases et livrables.
- Suivi des délais, livrables manquants, et projets critiques.
- Indicateurs clés : coût planifié vs réel, durée planifiée vs réelle.
- Alertes automatiques : dépassements budgétaires ou de délai.

2. Vue Géographique – Répartition & Planification

- Répartition des projets par région et pays.
- Carte interactive localisant les projets dans le monde.
- Planning des phases et livrables (Gantt simplifié).
- Filtres interactifs pour affiner l’analyse (région, type de projet, canal de distribution).

Comment utiliser les filtres

- Utilisez les menus déroulants en haut du tableau pour filtrer les données par **région, pays, type de projet** ou **canal de distribution**.
- Vous pouvez combiner plusieurs filtres pour cibler une zone spécifique (ex : *Europe + IT projects*).
- Cliquez sur un élément d’un graphique (par ex. une barre ou un segment) pour **filtrer automatiquement** les autres visuels du rapport.

Interprétation des indicateurs

- **Coût réel > coût planifié** → projet en dépassement budgétaire.
- **Durée réelle < durée planifiée et livrable manquant** → projet livré en avance.
- **Projets critiques (rouge)** → à prioriser pour suivi immédiat.

Support et contact

Pour toute question ou problème technique lié à ce rapport : support.projets@sanitoral.com

⚠ Questions et réponses sera retiré en décembre 2026.

Supprimer Questions et réponses


livrable réel par

Région			
Asia Pacific	Central/Eastern Europe-Middle East-Africa	North and Latin America	Western Europe

Types de Projets	
☐ IT - CRM Implementat...	
☐ Marketing - Launch of...	

Canaux de Distribution	
☐ Affiliate	
☐ Distributor	

Pays				
Afrique du Sud	Burkina Faso	Egypte	Grece	Japon
Albanie	Canada	Equateur	Hollande	Jordanie
Allemagne	Chine	Espagne	Hongrie	La Reunion
Belgique	Colombie	Estonie	Ile Maurice	Liban
Benin	Cote d'Ivoire	France	Indonesie	Lituanie
Bielorussie	Croatie	Gabon	Israel	Luxembourg
Bresil	Danemark	Gambie	Italie	Macedoine

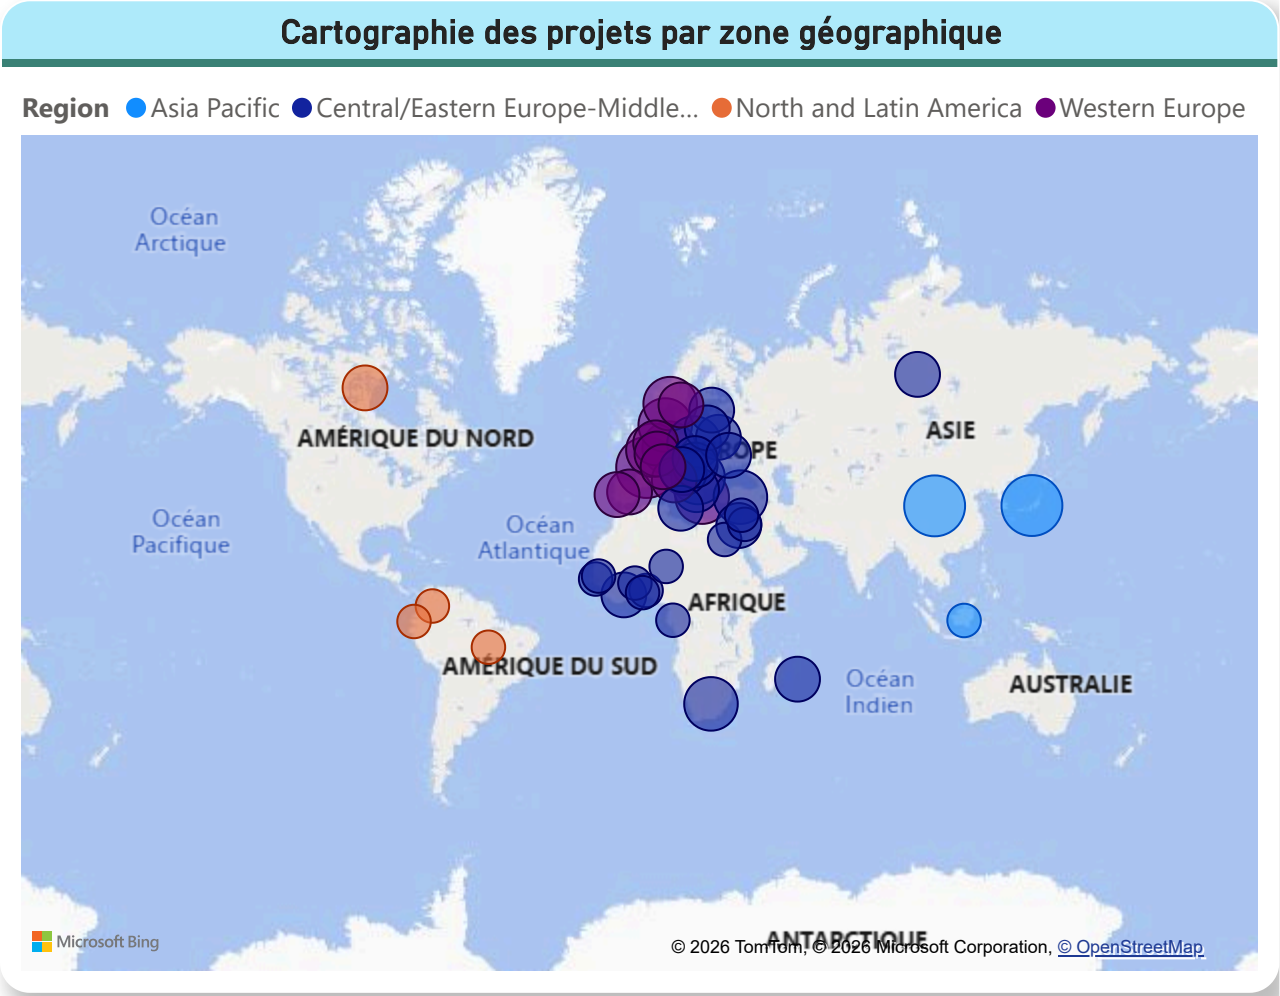


LEGENDE BULLE

⚠ % de complétion : état d’avancement basé sur la durée planifiée. À 100%, vérifier les livrables.

Livrable Manquant

916

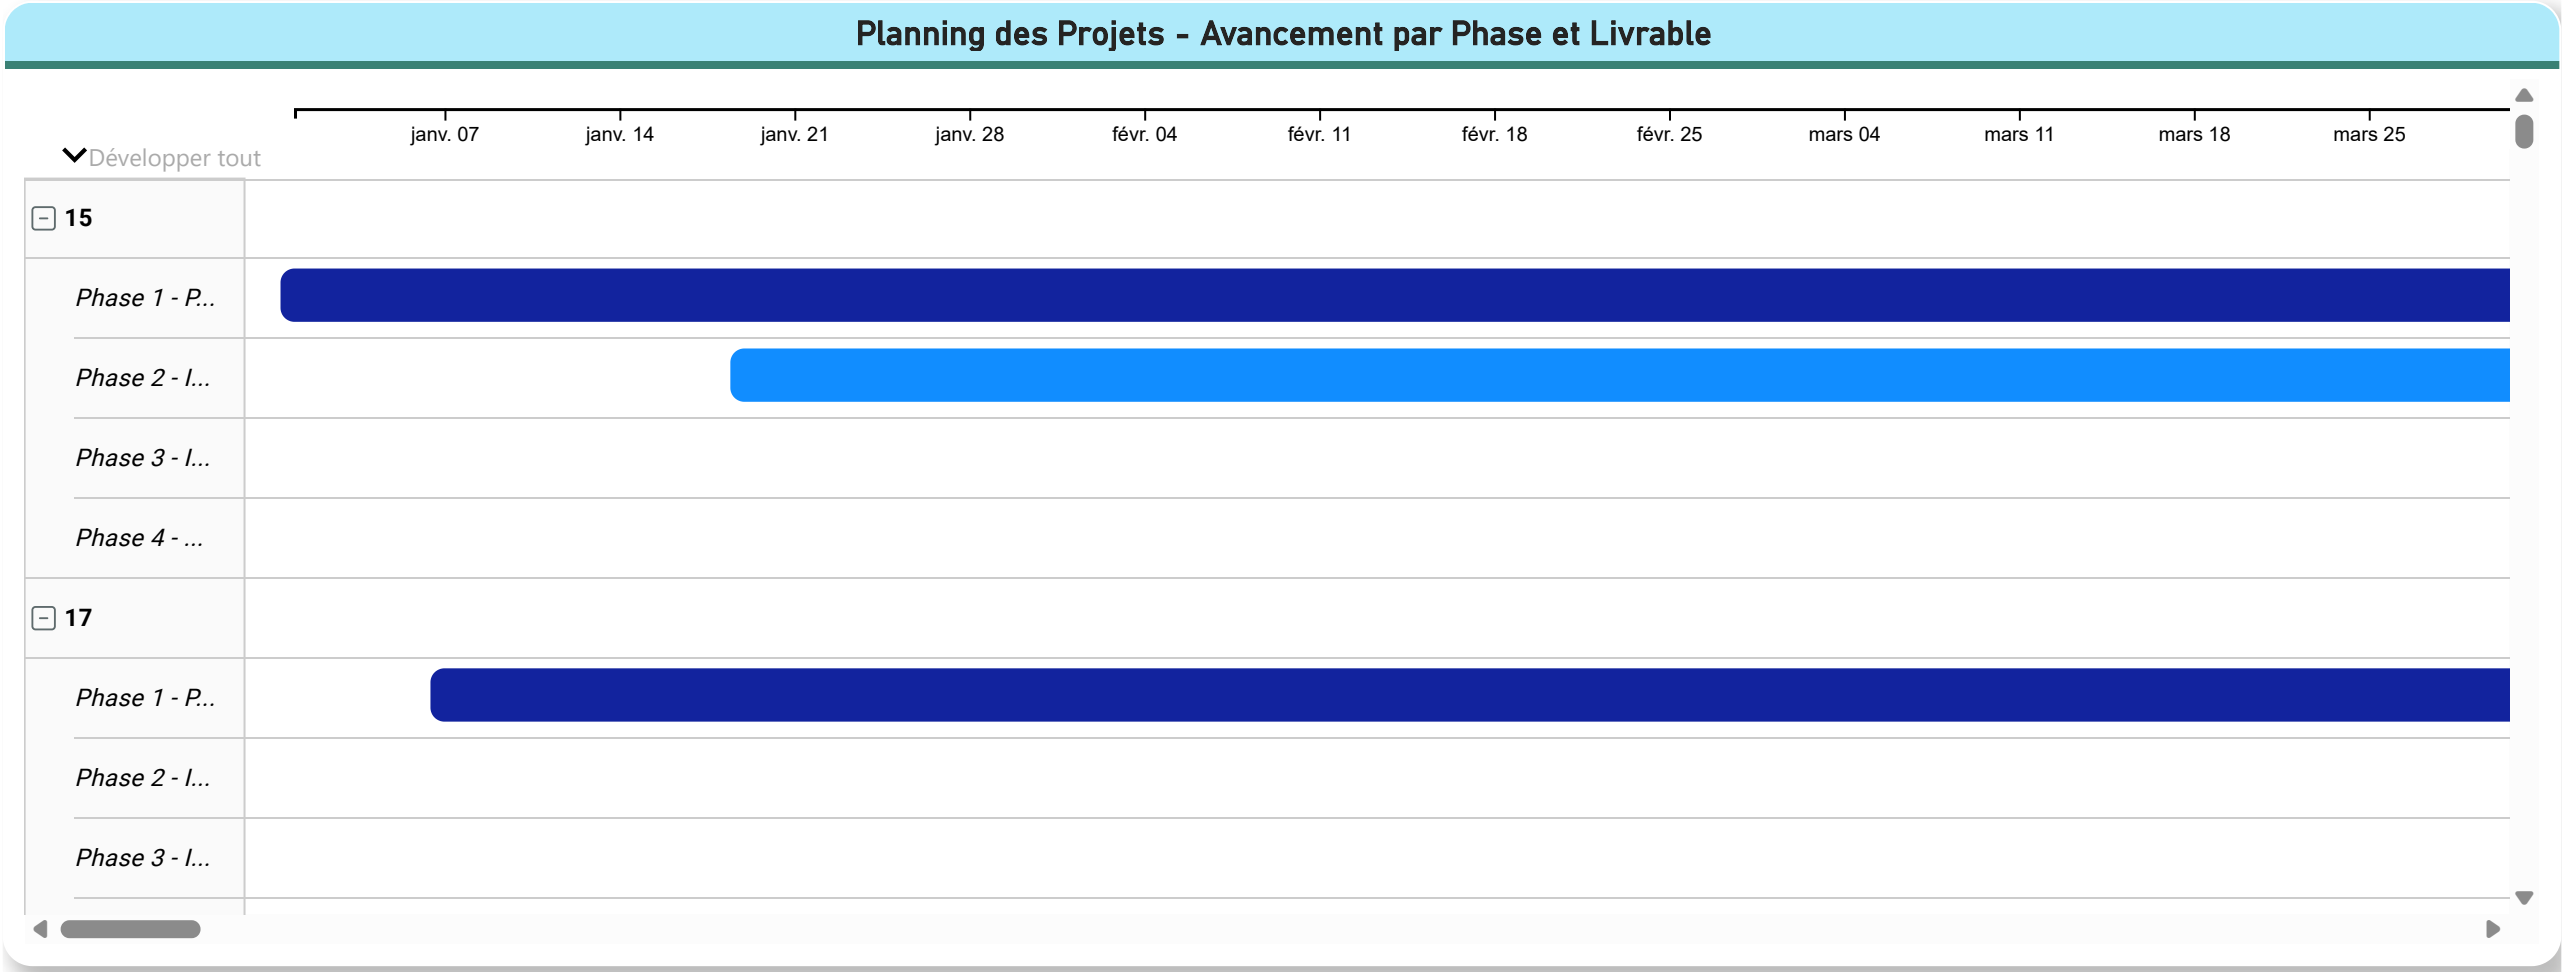

SANITORAL

NB Projects

104

NB Phases

520

Project ID

1	102	12	16	2	23	27	30	34	38	41
10	103	13	17	20	24	28	31	35	39	42
100	104	14	18	21	25	29	32	36	4	43
101	11	15	19	22	26	3	33	37	40	44

Région

Tout

Pays

Tout

Canaux de Distribution

Tout

Canaux de Distribution

Tout

COÛT LIVRE

● ▲ Dépassement du budget de 7,3%

DUREE PROJET

● Respect du Délai - 13,4%

Livrables Planifiés

8735

Coût Planifié

56,11M

Coût Réel

60,20M

Durée Planifiée

52,72K

Durée Réel

45,64K

Livrables Réels

7819

COÛT PLANIFIE VS REEL PAR PROJET

ETAT LIVRABLES PLANIFIES VS DUREE ACTUEL PAR PROJET

LEGENDE

◆ Phase Critique Livrable manquant + Délai dépassé

● Compris entre 10% et 15%

● Au dessus de 15%

● Compris entre 0 et 10%

STATUT DES PROJETS												
Project ID	Phase	Country	Coût Planifié	Coût Actuel	% Ecart Coût	Durée Planifiée	Durée Actuelle	% Ecart Durée	Livrables Planifiés	Livrables Actuels	% Ecart Livrables	STATUT PAR PHASE
37	Phase 3 - Implementation	Pologne	150 000,00	176 400,00	17,60	137	92	-32,85	32	32	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
48	Phase 4 - Manufacturing	Slovenie	900 000,00	959 700,00	6,63	167	133	-20,36	32	32	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
67	Phase A - Initiation	Macedoine	400,00	400,00	0,00	14	7	-50,00	32	32	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
74	Phase F - Post-deployment	Ukraine	1 400,00	1 400,00	0,00	172	113	-34,30	32	32	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
91	Phase E - Deployment	Canada	89 000,00	35 700,00	-59,89	144	118	-18,06	32	32	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
46	Phase 3 - Implementation	Macedoine	150 000,00	204 600,00	36,40	184	106	-42,39	31	31	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
49	Phase 1 - Planning	Ile Maurice	50 000,00	56 500,00	13,00	30	17	-43,33	32	31	-3,13	◆ EN COURS:: Livrables manquants (1) - Dan
69	Phase F - Post-deployment	Chine	2 800,00	3 400,00	21,43	187	110	-41,18	31	31	0,00	● ● ● TERMINÉ: PERFORMANT : Délai en a
75	Phase B -	Russie	16 100,00	15 600,00	-3,11	122	56	-54,10	32	31	-3,13	◆ EN COURS:: Livrables manquants (1) - Dan
Total			56 108 000,00	60 200 800,00	7,29	52722	45641	-13,43	8735	7819	-10,49	◆ EN COURS:: Livrables manquants (916) - D

ESN

DATA



Procédure de mise à jour pour une complète autonomie des utilisateurs sans assistance technique

I Vérifier ou modifier les connexions sources :

● Menu *Accueil* → *Transformer les données* → *Paramètre de la source de données* → *Visualisation du lien utilisé*

- Les sources sont :  \\mac\local\downloads\donnees_sanitoral.xlsx

=> **_Remplacer le fichier source si nécessaire :** *Changer la source* → Sélectionner le nouveau fichier à importer.

⚠ Fichier composé de 7 tables principales : respecté format attendu, types de données,...

Pour simplifier les mesures, les colonnes *Actual_Costs*, *Actual_Deliverable* et *Actual_Duration* ont été **fusionnées** dans la table **Projects_Plans**. Cette fusion ne modifie **ni la structure, ni la typologie** des données importées.

Conseil : noter dans un coin de la page la date de dernière mise à jour et nom - "Dernière actualisation effectuée par [Nom] le [Date]"

II Actualiser les données :

● Menu *Accueil* → *Actualiser tout* → Attendre la mise à jour complète.

● Vérifier les visuels → Contrôler les colonnes, valeurs clés, (ex. Nb Projets, Coûts, % respect délais)...

Une fois les données actualisées, cliquez sur **Fermer et appliquer** dans Power Query pour enregistrer les transformations, si vous en avez effectuées.

Le tableau de bord est désormais actualisé avec les nouvelles données et tous les visuels se mettent automatiquement à jour.

III Enregistrement du fichier :

○ Accueil → *Publier* → *Espace de travail [nom]*.

- ⚡ *Conseil : note dans un coin de la page la date de dernière mise à jour et ton nom ("Dernière actualisation effectuée par [Nom] le [Date]")*.

Modèle de données (relations et structure)

Objectif :

Comprendre la structure du modèle pour pouvoir le modifier si besoin (ex. ajout de nouveaux champs ou relations).

I Structure actuelle :

- **Table "Projects_Plans"** : contient les informations principales planifiés sur les projets en fonction de chaque phases : Project ID, PhaseStart, Date, Planned_Duration, Planned_Cost, Planned_Deliverable.
- **Table "Actual_Deliverable"** : Indique le nombre de livrables réels associées à chaque projet en fonction des phases: Project ID, Phase, Actual_Deliverable.
- **Table "Actual_Costs"** : Indique les coûts réels associées à chaque projet en fonction des phases : Project ID, Phase, Actual_Cost
- **Table "Actual_Duration"** : Indique la durée réels associées à chaque projet en fonction des phases: Project ID, Phase, Actual_Duration.
- **Table "Project_Type"** : Indique le type de projet (Marketing, IT) associées à chaque projet Project ID, Project Type.
- **Table "Projects_Locations"** : Indique la localisation de chaque pays associées à chaque projet : Project ID, Country.
- **Table "Country_Profiles"** : Indique la localisation du continent de chaque pays associées à chaque projet : Country, Région, Type.

II Relations principales :

Les Tables **"Actual_Deliverable"**, **"Actual_Costs"**, **"Actual_Duration"** sont toutes reliées à la table **"Projects_Plans"** via la création d'une colonne commune issu de la concaténation de Project ID et de Phase: **ProjectPhaseKey** . (Clé)

Les Tables **"Project_Type"**, **"Projects_Locations"** sont toutes reliées à la table **"Projects_Plans"** via la colonne commune **Project ID**. (Clé)

La Table **"Projects_Locations"** et **"Country_Profiles"** sont reliées ensemble via la colonne commune **Country**. (Clé)

Pays

Afrique du Sud

Albanie

Allemagne





Product Strategy Canvas

Rédacteur	Data Analyst ESN Data	Date	Jeudi 25	Nom du client	Office Sanitorial, chef de projet : Sophie
-----------	-----------------------	------	----------	---------------	--

Veillez vous appuyer sur la note de cadrage de la mission pour remplir le tableau ci-dessous.

Nom du tableau de bord : Tableau de bord de suivi projets <u>Marketing & IT</u>		Objectif du dashboard : Création d'un tableau de bord pour suivre avancement des projets	
Utilisateurs	Stories		
Directeur Général	Suivi des performances globales de tous les projets pour décider de leur arrêt ou poursuite	Être alerter quand : un des projets dépasse 15% du coût, <u>non respect</u> des deadlines, pb livrables produits par rapport au planning fixé pour pouvoir intervenir rapidement	Identifier les tendances globales pour définir des axes stratégiques pour chaque projet
Directeurs Régionaux	Visualiser uniquement les projets de leur région pour voir avancement	Être alerter qd un projet de sa région dépasse le coût de plus de 15%, délai, livrables pour intervenir auprès du Directeur pays concerné	Comparer la performance entre les pays de leur région pour identifier ceux qui ont besoin d'un accompagnement
Directeurs <u>de Pays</u>	Suivre en détail les projets dont ils sont responsables afin de réagir rapidement en cas de problème	Analyser et identifier les projets à risques via indicateurs : coût, délais, livrable	Suivre chacun des projets sous leur responsabilité
